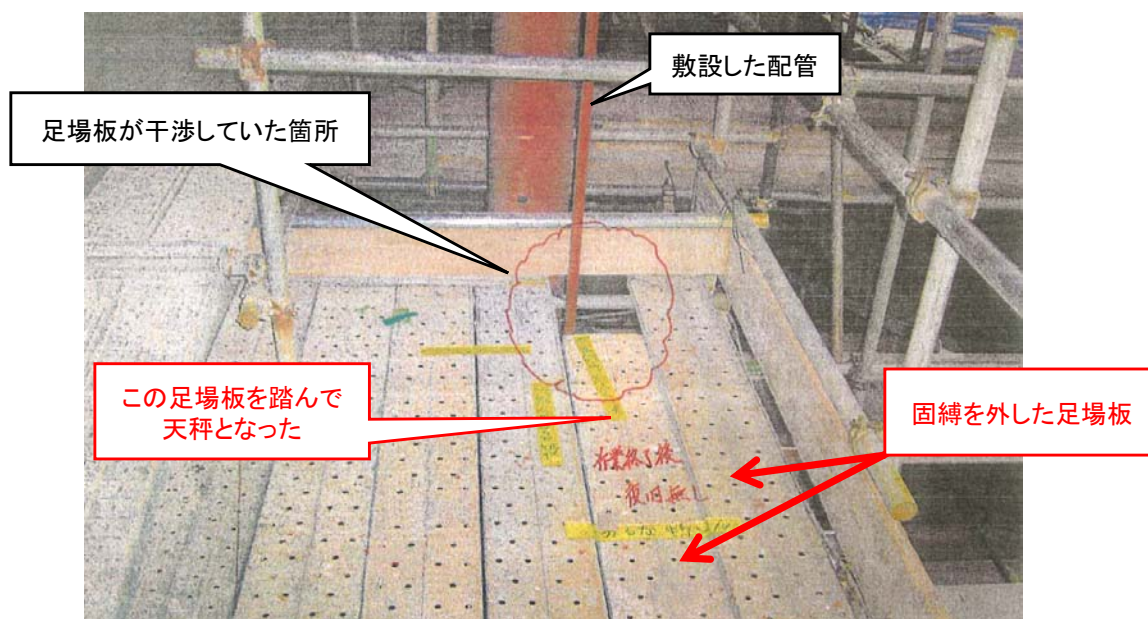


**足場板を移動させた際に固縛しなかったため 他社作業員が天秤状態となった****【発生状況】**

配管敷設ラインに他社の足場が干渉するため 足場板を移動させて施工した。その後 移動させた足場板を固縛していなかったため、他社作業員が固縛していない足場板に乗った際に天秤状態となり 墜落しそうになった。

※足場の下にあった鉄骨に足が引っ掛かったため、墜落にはいたらなかった。

**【原因・問題点】**

- ①移動させた足場板を固縛しないまま放置した。(作業が終了し、帰宅することに気をとられていた)
- ②他社足場を改造することを監督者に報告しなかったため、他社への連絡がされなかった。

**【対策】**

- ①足場板の固縛を外した場合は、その都度 元の状態に復旧するか、適切な箇所  
所で固縛する。
- ②足場改造後に危険な箇所が生じた場合は、行き止まり処置や注意喚起表示  
を行い、第三者が分かる状態にする。
- ③他社の足場を改造する必要が生じた際は、監督者へ連絡し 許可が出た上で  
作業を行う
